

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成31年1月〇日

計画の名称	1 市民に親しまれる加治丘陵の保全と活用		
計画の期間	平成25年度 ～ 平成29年度 (5年間)	交付対象	入間市
計画の目標			

緑の基本計画では将来都市像である「香り豊かな緑の文化都市」を目指し、緑の拠点、骨格である「加治丘陵」を保全・活用し、良好な環境を形成すると位置付けられている。「加治丘陵さとやま計画」では自然体験区域を「自然環境と調和し、広く市民に親しまれる入間市のシンボリックな自然公園」と位置付けられており、事業の推進を図り、市民に潤いと憩いの場を提供する。

計画の成果目標（定量的指標）	・（仮称）加治丘陵さとやま自然公園の用地取得率を51.8%にする。		
----------------	-----------------------------------	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)	
(仮称) 加治丘陵さとやま自然公園の用地取得率 (%)	44.5%	48.1%	51.8%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	323百万円	A	323百万円	B		C	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%
-------	---------------	--------	---	--------	---	--	---	---	---------------------------	------

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
社会資本総合整備計画の事後評価として入間市で実施	平成30年度
	公表の方法 市ホームページ及び窓口


1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
1-A-1	公園	一般	入間市	直接	入間市	(仮称) 加治丘陵さとやま自然公園	都市公園 110.2ha 用地取得	入間市						323	
合計												323			
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
合計															
番号											備考				

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H25	H26	H27	H28	H29		
1-C-1	公園	一般	入間市	直接	入間市	市道幹28号線災害防除計画策定事業	L=940m	入間市		●●●●●				0	
1-C-2	公園	一般	入間市	直接	入間市	(仮称) 加治丘陵さとやま自然公園案内板等整備事業	案内板等整備	入間市					●●●●●	0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考	
1-C-1	(仮称) 加治丘陵さとやま自然公園の中央部を南北に横断している市道幹28号線の周辺部の樹木や法面を調査して災害防除計画を策定し、交通の安全を確保する。														
1-C-2	(仮称) 加治丘陵さとやま自然公園の案内板等を設置し、利用者の利便性を向上させる。														
2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況															
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況				<p>(仮称) 加治丘陵さとやま自然公園事業面積110.2haのうち、計画当初471,130.29㎡であった公有地面積は、平成25年度から平成29年度に合計112,101㎡を取得した結果、平成29年度末時点で583,231.29㎡、用地取得率は最終目標値の51.8%を上回る52.92%となり、「探検の森 休憩園地」「探検の森 自然探勝路」「四季の森 休憩園地」の施設整備を行った。また、公有地化が進んだことにより、広範囲に渡り一団の山林として下草刈や間伐等の山林管理が行われるようになった結果、里山をテーマとした自然環境を保全し、散策者に良好な山林環境の提供をすることができた。</p>											
II 定量的指標の達成状況				最終目標値	51.8%	目標値と実績値 に差が出た要因	計画策定当初時の想定取得単価より、地価の下落の影響から5年間の1㎡あたりの不動産鑑定評価による平均取得単価が下がり、想定取得面積100,000㎡を上回る112,101㎡の取得が実現したため。								
				最終実績値	52.9%										
3. 特記事項（今後の方針等）															
<ul style="list-style-type: none"> <li>・（仮称）加治丘陵さとやま自然公園事業は、次期社会資本総合整備計画においても継続して事業を進めていく。</li> <li>・今後も用地取得を計画的に進め、施設整備を行う。完成済の施設については一部開設告示を行い部分開放することで、市民に潤いと憩いの場を提供する。</li> </ul>															

(参考図面) 市街地整備

計画の名称	市民に親しまれる加治丘陵地の保全と活用		
計画の期間	平成25年度 ~ 平成29年度 (5年間)	交付対象	埼玉県入間市

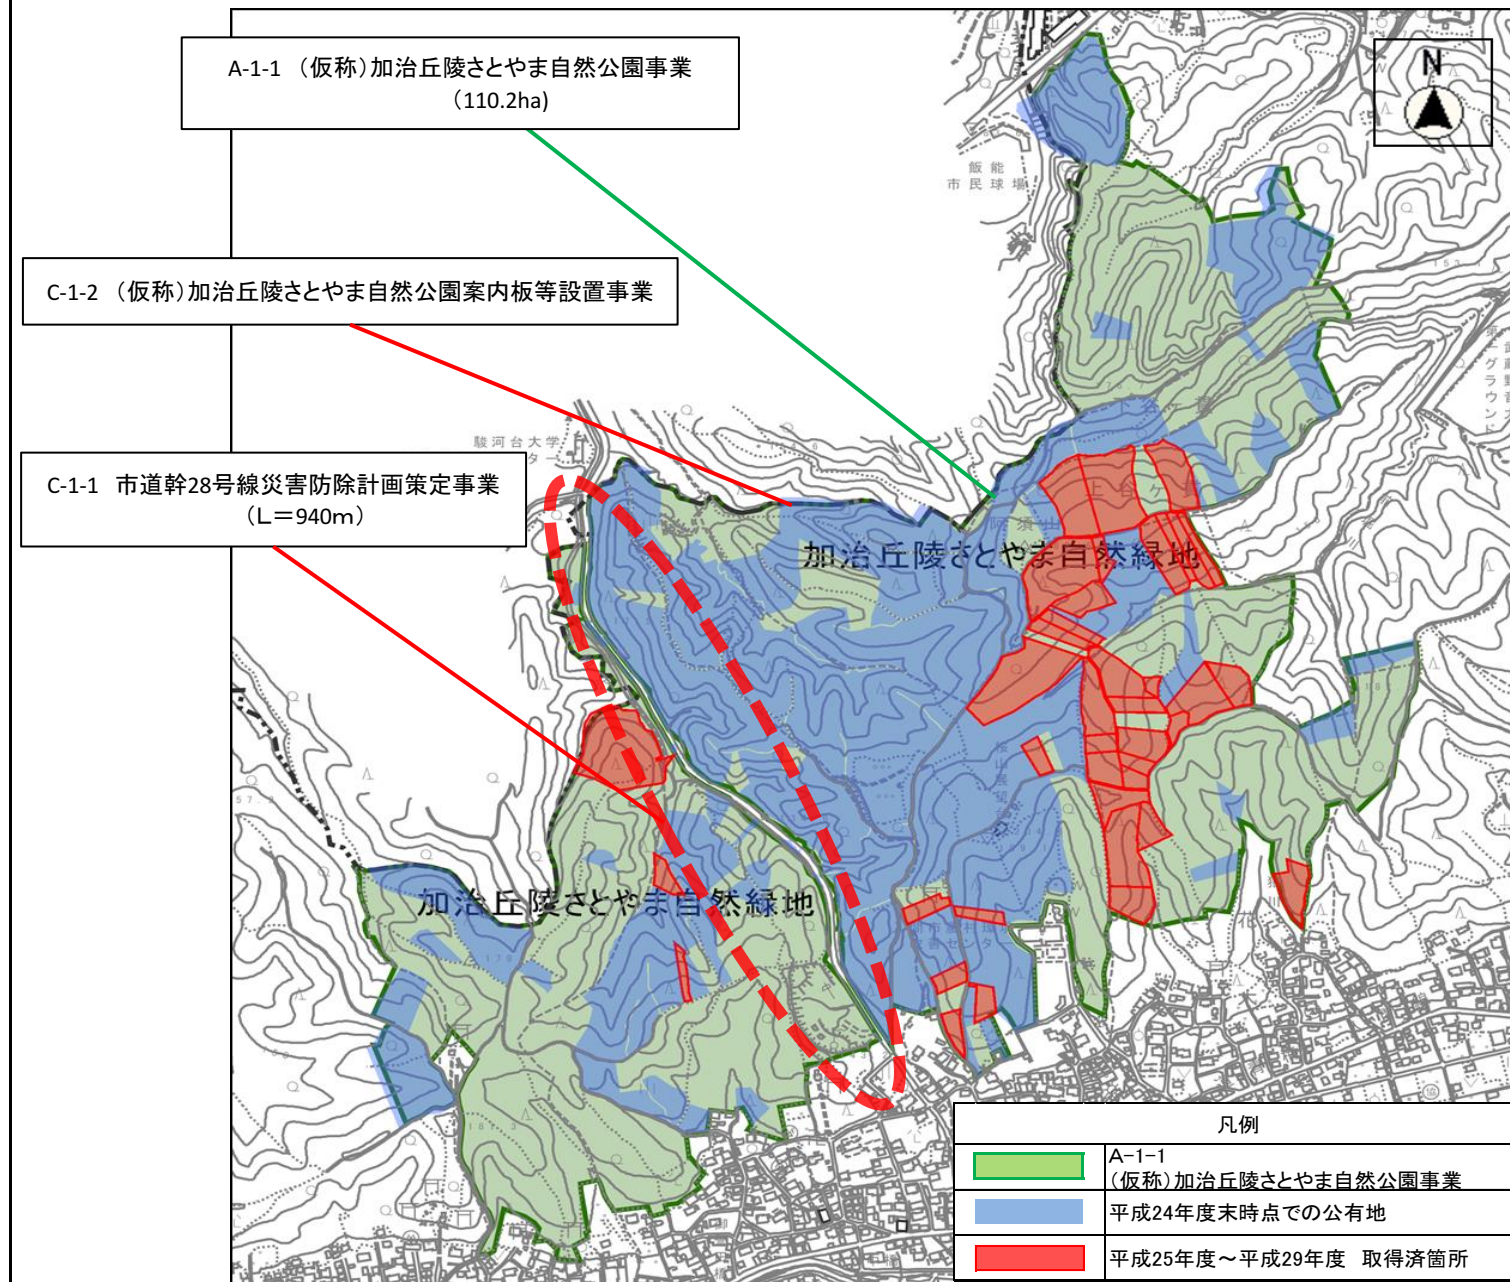

凡例	
	A-1-1 (仮称)加治丘陵さとやま自然公園事業
	平成24年度末時点での公有地
	平成25年度～平成29年度 取得済箇所

入間市全図

