○移転予定スケジュール

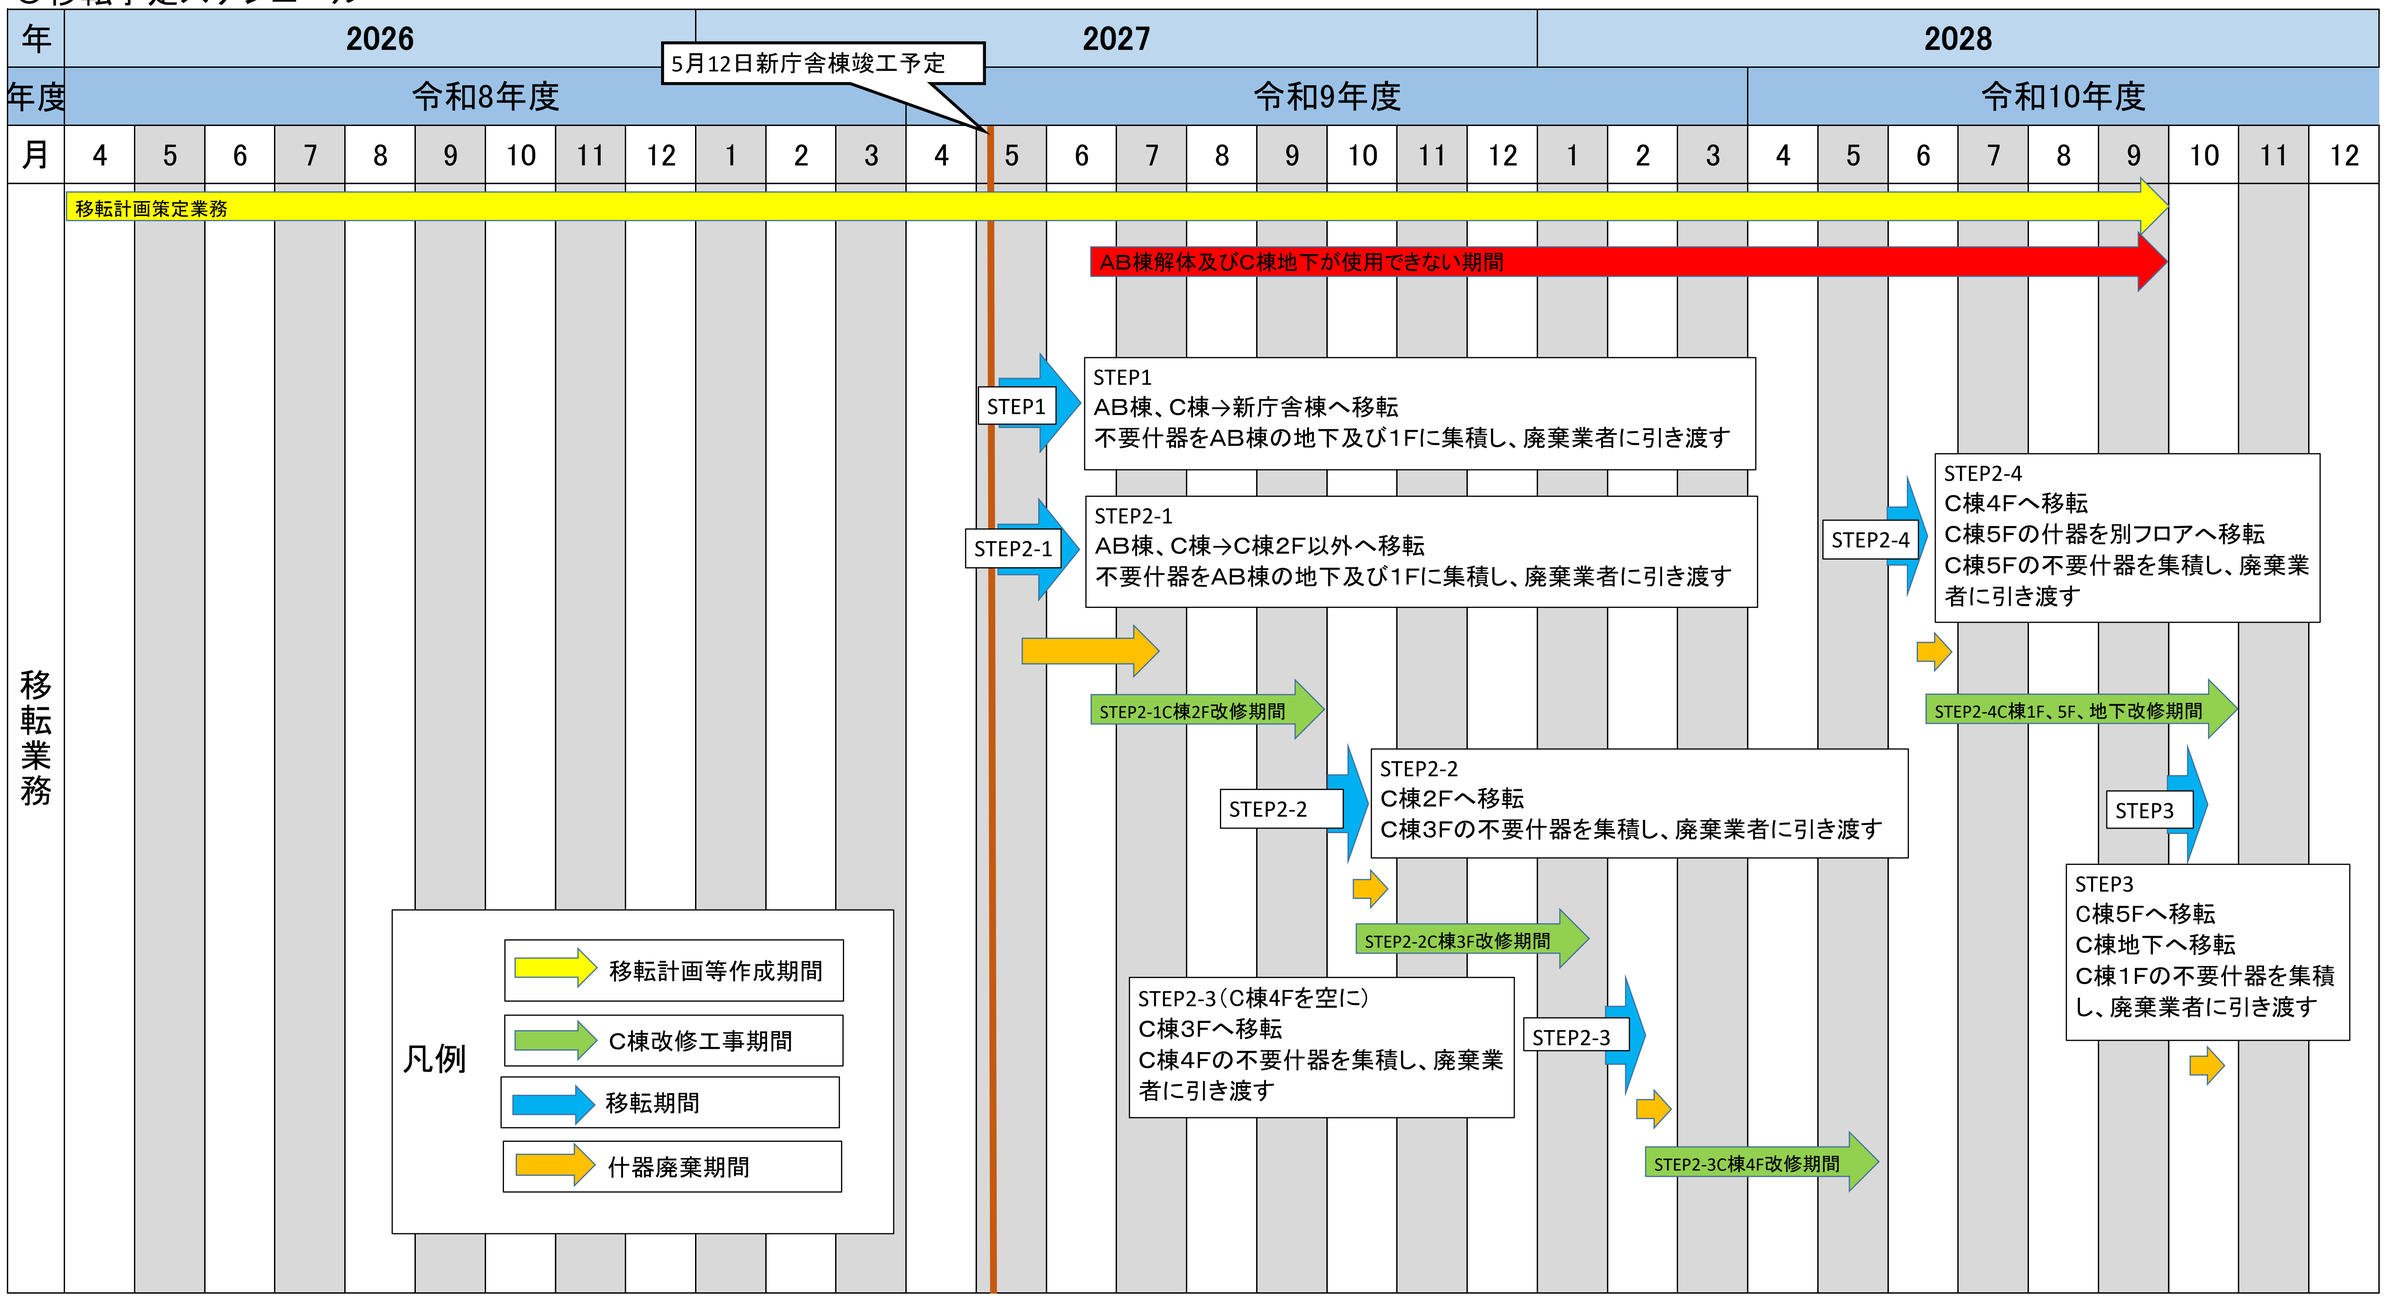
年
2026
2027
2028
年度
令和8年度
令和9年度
令和10年度
5月12日新庁舎棟竣工予定
月
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
移転業務
移転計画策定業務
AB棟解体及びC棟地下が使用できない期間
STEP1
STEP1
AB棟、C棟→新庁舎棟へ移転
不要什器をAB棟の地下及び1Fに集積し、廃棄業者に引き渡す
STEP2-1
STEP2-1
AB棟、C棟→C棟2F以外へ移転
不要什器をAB棟の地下及び1Fに集積し、廃棄業者に引き渡す
STEP2-1C棟2F改修期間
STEP2-2
STEP2-2
C棟2Fへ移転
C棟3Fの不要什器を集積し、廃棄業者に引き渡す
STEP2-2C棟3F改修期間
STEP2-3
STEP2-3（C棟4Fを空に）
C棟3Fへ移転
C棟4Fの不要什器を集積し、廃棄業者に引き渡す
STEP2-3C棟4F改修期間
STEP2-4
STEP2-4
C棟4Fへ移転
C棟5Fの什器を別フロアへ移転
C棟5Fの不要什器を集積し、廃棄業者に引き渡す
STEP2-4C棟1F、5F、地下改修期間
STEP3
STEP3
C棟5Fへ移転
C棟地下へ移転
C棟1Fの不要什器を集積し、廃棄業者に引き渡す
凡例
移転計画等作成期間
C棟改修工事期間
移転期間
什器廃棄期間
